São Francisco/MG, 09 de Abril de 2025.

Oficio nº.: 62/2025.
Assunto: Resposta à Requerimento

Ilustre Sr. Daniel Fonseca Rocha – Presidente da Câmara dos Vereadores;

Com os cordiais cumprimentos, no uso das minhas atribuições, venho, através deste, responder o que fora solicitado em Requerimento nº 03/2025. Segue em anexo resposta emitida pela Secretaria Municipal de Obras e Gestão de Convênios contendo as informações detalhadas referentes a solicitação, qual seja: andamento do Projeto da Ponte do Tabuado.

Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima.

Atenciosamente,

MIGUEL PAULO SOUZA FILHO:85027049668

Assinado de forma digital por MIGUEL PAULO SOUZA FILHO:85027049668
Dados: 2025.04.09 11:56:17 -03'00'

MIGUEL PAULO DE SOUZA FILHO
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO MG
RECEBEMOS
Em, 10/04/2025
SECRETÁRIA

São Francisco, 09 de abril de 2025

Oficio nº. 32 / 2025
Para: Procuradoria Jurídica
Assunto: Comunica sobre Requerimento de vereador
Referência: Ofício nº 61/2025 - Requerimento Nº: 03/2025

Senhor Procurador,

Em atenção ao Ofício nº 61/2025, sobre requerimento do vereador José Delvan Caires da Silva, o qual requer informações sobre o andamento da obra de construção da ponte do Tabuado, informamos o que se segue:

A referida obra esteve com andamento mais vagaroso entre os meses de dezembro/2024 e fevereiro/2025, em decorrência do período chuvoso na região, o que acarretou no aumento do volume de águas no leito do córrego, conforme fotos em relatório anexo 1.

Atualmente a referida obra está em andamento normal, já tendo sido realizados os serviços de concretagem das vigas e da laje da ponte, conforme fotos em relatório anexo 2.

Na oportunidade, informamos que, na presente semana, será realizado o serviço de concretagem do guarda-corpo desta ponte, concluindo, desta forma, a obra por parte da empresa contratada. Cabe ressaltar que é necessário aguardar um prazo de 21 (vinte e um) dias para a cura do concreto, para garantir a resistência e minimizar manifestações patológicas nas estruturas da ponte.

Posteriormente, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento realizará o serviço de aterro nas cabeceiras da ponte, para que seja liberado o tráfego de veículo naquele local.

Colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

CEZAR BOTELHO FILHO:09841827646

Assinado de forma digital por CEZAR BOTELHO FILHO:09841827646
Dados: 2025.04.09 12:44:57 -03'00'

Cézar Botelho Filho
Secretário Municipal de Obras e Gestão de Convênios

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

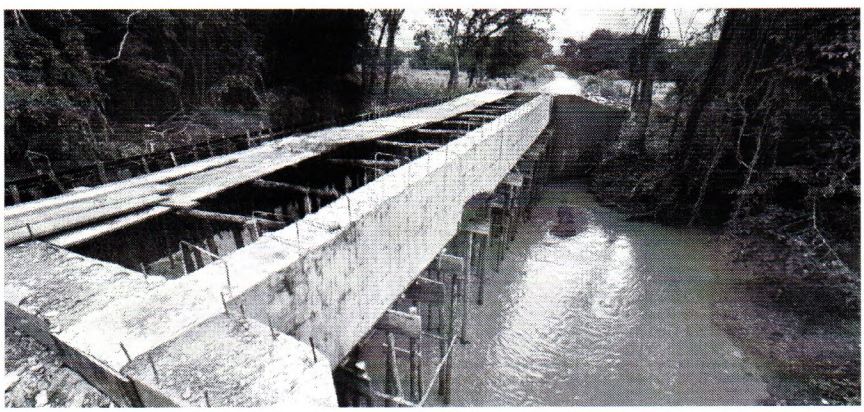

FOTO 4

LEGENDA: Vista do **local** da obra de construção da ponte do Tabuado, município de São Francisco/MG, durante **a oco**rrência do período chuvoso (dez./2024 - fev./2025)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 2

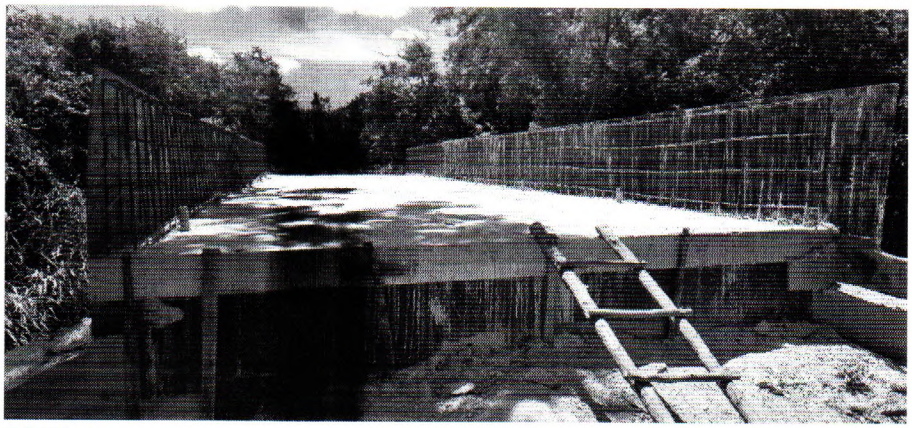

FOTO 1

FOTO 2

LEGENDA: Vista atual do local da obra de construção da ponte do Tabuado, município de São Francisco/MG.
